

<< 지역정보화본부 사업 설명회 >>

- 청백-e 시스템 운영지원 및 유지보수
- 청백-e 시스템 전국 보급 사업
- 자치단체 우수정보시스템 공동 활용지원
- 지방자치단체 정보화사업 사전협의 및 시스템 운영지원
- 정보화마을 운영 및 중앙시스템 유지관리 운영평가
- 정보화마을 시스템 고도화 사업

**청백-e(통합 상시모니터링) 시스템
운영지원 및 유지관리 사업**

목 차

- I 사업 개요
- II 업무 및 시스템 현황
- III 주요 과업내용

I. 사업개요

사업개요

- 사업명 : 청백-e(통합 상시모니터링) 시스템 운영지원 및 유지관리
- 사업기간 : 2014. 3. 1. ~ 12.31.(10개월)
- 발주금액(외주용역금액) : 759백만원

사업경과


- 청백-e 시스템 구축 ISP사업 추진(2011. 2 ~ 11)
- 개별 행정정보시스템 모니터링 기능 시범운영(2009 ~ 2011)
- 2012 경기도 청백-e 시스템 개발 및 시범사업(2012. 5 ~ 12)
※시범자치단체 : 경기도, 수원시, 고양시, 파주시, 광주시, 가평군
- 2013 청백-e 시스템 운영지원 및 광역시 시범사업(2013. 4 ~ 12)
※시범자치단체 : 인천광역시, 부평구, 서구, 용진군, 연수구
- 사업추진현황 : 1월 말 조달 발주 예정

II. 업무 및 시스템 현황

- 자치단체 5대 행정정보시스템을 연계하여 업무처리 과정을 실무자, 관리자, 감사부서가 협업으로 상시 모니터링 하는 비리 및 행정착오 사전 예방시스템으로 지방행정의 투명성과 효율성 제고

업무(서비스) 현황

- 청백-e 시스템 주요기능

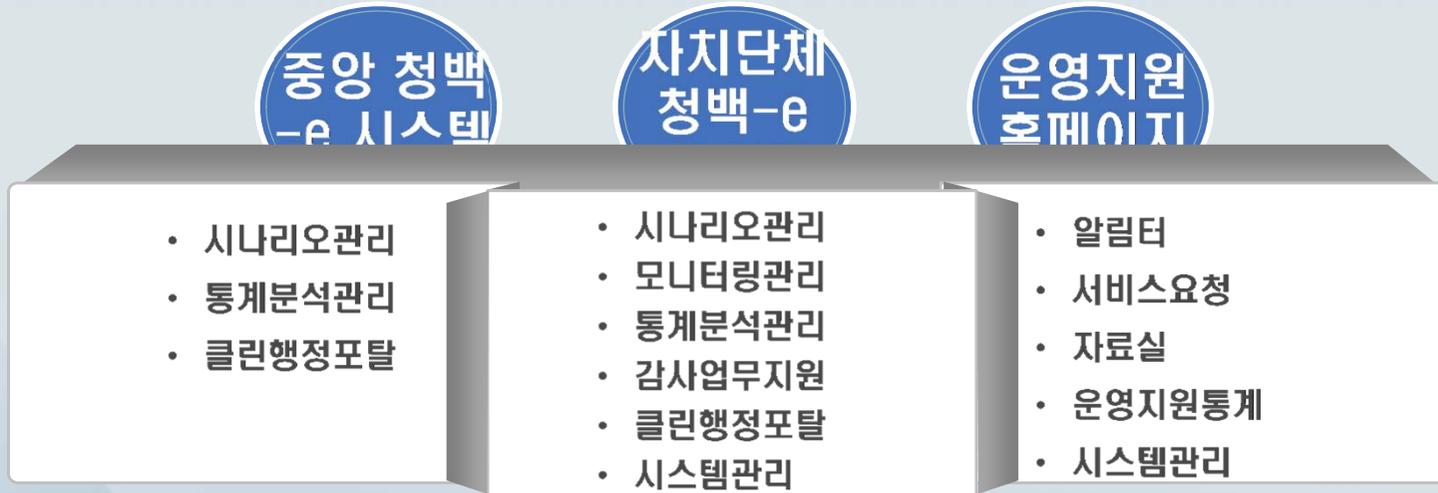


- 예방행정 시나리오

지방세 15종, 지방재정 25종, 세외수입 17종, 시도 및 새올 행정 11종, 지방인사 10종 등 총 78종의 예방행정 시나리오

II. 업무 및 시스템 현황

업무 구성도

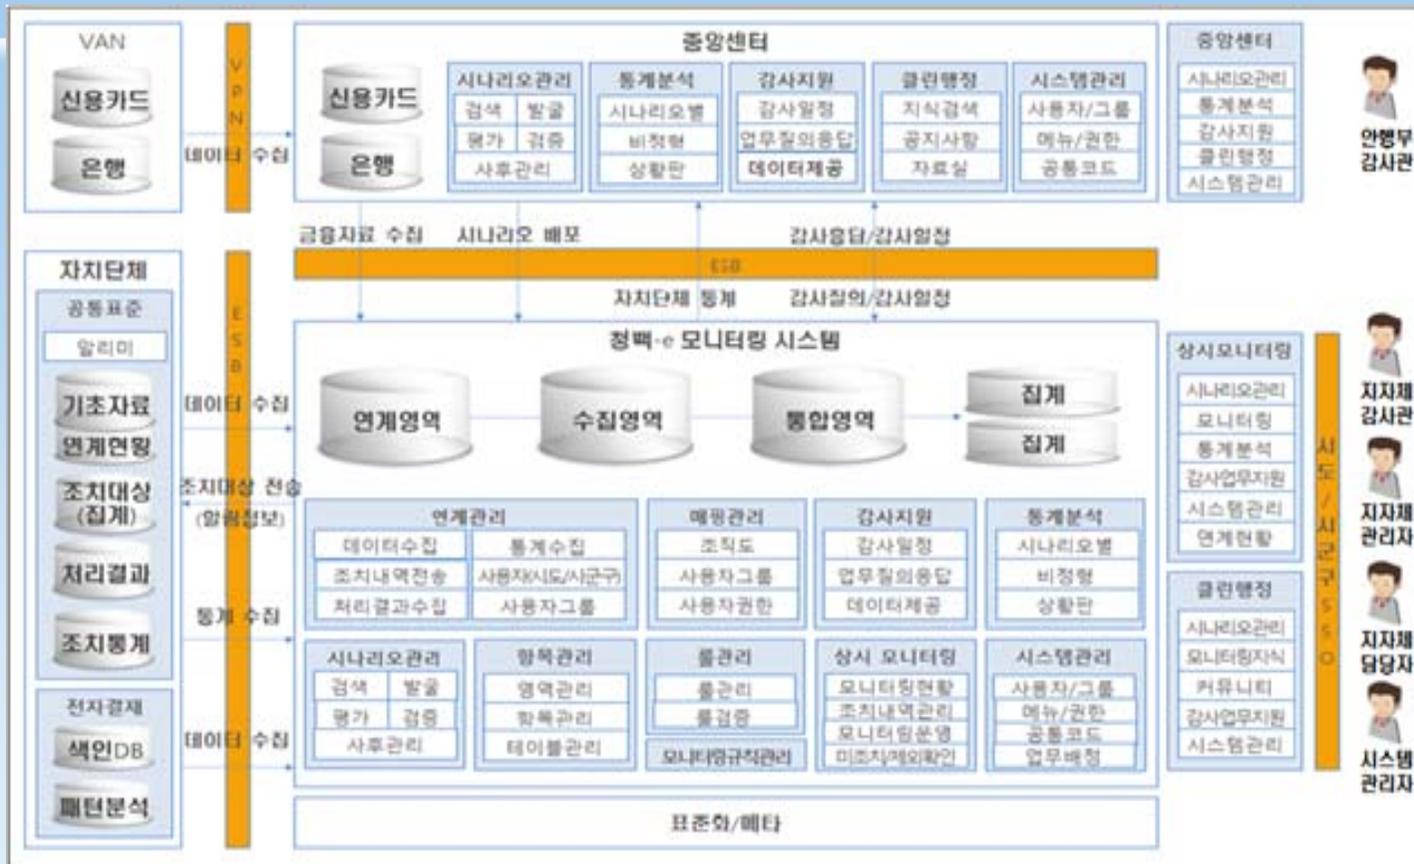

III. 주요 과업내용

운영지원 및 유지보수 부문(1)

- 대상기관 : 시범자치단체(광역2, 기초9)
- 시범자치단체 대상 청백-e 시스템 운영지원 및 유지보수
 - 시스템 개선 요구 사항의 신속한 접수와 처리를 위한 Help Desk 운영
 - 예방행정 프로그램 및 통계 기능 등 응용 SW개선
 - 시스템 사용자 교육, 기술지원 등의 시범 자치단체 지원
 - 2013년 기능 개선 요구 사항 중, 장기 추진 과제 기능 개발 및 적용
- 신규 예방행정 시나리오 개발
 - 국토교통부, 보건복지부 등 타 부처 소관 정보시스템 중심으로 신규 예방행정 시나리오 개발
 - 2013년 기 개발된 예방행정 시나리오에 대한 시스템 적용 가능성 파악 및 유효성 검증
 - 시나리오 개발 및 유효성 검증을 위한 중앙부처 및 자치단체 업무담당자 합동집무 실시
 - 자치단체 대상 청백-e 시스템과 e-호조 시스템 간의 실시간 카드사용 정보 연계 체계 구축

III. 주요 과업내용

운영지원 및 유지보수 부문(2)

- 전국 확산 대비 운영지원 홈페이지 개선 및 운영체계 개선
 - 운영지원 업무 관련 통계 기능 강화 및 운영지원 홈페이지 현황 실시간 상황판 구축 및 운영
 - 운영지원 홈페이지를 통한 사용자 교육 신청·지원 및 사용자 만족도 조사 체계 마련
 - 보급·확산 대상 자치단체 관련 서비스 요청 사항 접수·이관
 - 예방행정 시나리오 생애주기 관련 청백-e 시스템과의 연동 체계 구축
- 청백-e 시스템 전국 확산 사업 지원
 - 전국 확산에 따른 응용프로그램 배포 시스템 구축 지원 및 운영
 - 확산 자치단체 환경 예방행정 시나리오 개선 및 시스템 적용 지원
 - 시스템 활용을 위한 개별 행정정보시스템과 연계 지원 및 초기자료 구축 지원
- 기타 사항
 - 자치단체 요청 시 의견수렴 및 문제 해결을 위한 현장 방문
 - 예방행정 프로그램 추가에 따른 교육 교재 및 매뉴얼 등 산출물 현행화
 - 예방 프로그램 추가 개발 관련 업무지원

III. 주요 과업내용

주요 추진 일정

구분			2014											
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
업무수행	운영지원	청백-e 시스템 관련 문의사항 응대	■											
	응용 SW 개선	청백-e 시스템 운영관리 홈페이지 개선	■											
	신규 개발	신규 예방행정 프로그램 개발, 적용	■											
	프로그램 전환	개별 행정시스템 단수 14종 프로그램 청백-e 시스템 전환	■											
	금융자료 연계	금융자료 및 e-호조 연계 체계 구축	■											
	외부감리	운영 사업 감리용역 추진	▼											
결과보고		위탁사업비 결산 업무수행결과보고	■											
기타사항	정기보고 및 워크숍	정기보고(착수, 중간, 완료) 합동집무(4회 정도)	▼						▼			▼		
	사용자 교육	시범자치단체 사용자 교육(수시)	■											

담당자 연락처

- 한국지역정보개발원 지역정보화본부 정보화개발과
이영석 선임 (02-3279-0876, marklee@klid.or.kr)

[별표] 78종 예방행정 시나리오 목록(1)

구분	No	시나리오 명	연계 대상
지방세 (15)	1	대형사업장(식당, 병원 등)의 주민세 과세 누락 방지	새울
	2	지방세 체납자의 대금(공사, 용역 등) 지급 전 체납금액 압류 누락 방지	재정
	3	국·도·시유지 매각이후 취득세 과세누락 방지	세외수입
	4	국·도·시유지 매각에 따른 재산세 소유자정보 변경 누락 방지	세외수입
	5	인·허가된 유흥주점에 대한 취득세 중과세 누락 방지	새울
	6	인·허가된 유흥주점에 대한 재산세 중과세 누락 방지	새울
	7	건축행정 준공허가자료에 대한 재산세 신규 등록 누락 방지	새울
	8	건축행정 준공허가자료에 대한 취득세 신고 누락 방지	새울
	9	국·공유 자산 매입에 따른 지방세 지출예산 자료 누락 방지	새울
	10	불법건축물 이행강제금 부과에 따른 취득세 부과 누락 방지	세외수입
	11	불법건축물 이행강제금 부과에 따른 재산세 정보(면적 등) 변경 누락 방지	세외수입
	12	부동산 실명법 위반자에 대한 취득세 부과 누락 방지	세외수입
	13	자동차 연식 임의변경에 의한 취득세 부당 경감 방지	-
	14	등록면허세납부추소에 따른 환급 후 등기 등록자에 대한 등록면허세 추징 누락 방지	-
	15	지방세 체납자 세외수입 환급액 총당 지원	세외수입
지방 재정 (25)	1	급여 지급 불가 대상자(퇴직자 등)에 대한 급여 지급 방지	인사
	2	공무원 급여 중 근로소득세 횡령 방지	지방세, 인사
	3	일반지출 지급일계와 금고은행의 출금일계 불일치 방지	금고은행
	4	일상경비 지급일계와 금고은행의 출금일계 불일치 방지	금고은행
	5	세입세출외현금 일계와 금고은행의 입·출금일계 불일치 방지	금고은행
	6	기금담당자의 수기 지출 처리 방지	금고은행
	7	공금 휴면계좌에 대한 신속한 해지를 통한 세원사장 방지	금고은행
	8	타 회계 여유자금을 정당한 절차 없이 유용하는 행위 방지	금고은행
	9	현금영수증과 지출정보 불일치 방지	현금영수증
	10	법인카드 사용에 따른 대금 연체·과오납 등 방지	카드사
	11	업무와 무관한 시간에 법인카드 사용 방지	카드사
	12	근무지 이외지역에서 법인카드 사용 방지	카드사
	13	사용금지 업종에 대한 법인카드 사용 방지	카드사
	14	동일일자 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용 방지	카드사
	15	e-호조 상에서 본인 권한 밖의 결재행위 방지	-
	16	e-호조 회계업무 결재 승인처리 이중 권한 방지	전자결재
	17	일반지출자료의 소급 승인 방지	-
	18	취득 계약물품의 자산등록 누락 방지	시도/새울
	19	공유재산 토지 취득에 따른 자산 등록 누락 방지	시도/새울
	20	공유재산 건물 취득에 따른 자산 등록 누락 방지	시도/새울
	21	결산 시 자금이 없는 사업에 대한 이월처리 방지	-
	22	집행정보 이월 확정 후 전년도 예산액으로 재품의 방지	-
	23	예산현액과 예산배정계획액 불일치 방지	-
	24	예산편성액, 이월액 등 예산현액 불일치 방지	-
	25	이월예산액과 예산배정액 불일치 방지	-

[별표] 78종 예방행정 시나리오 목록(2)

구분	No	시나리오 명	연계 대상
세외수입 (17)	1	체납자 압류재산 매각으로 세외 수입 체납분 교부 청구 누락 방지	지방세
	2	세외수입 체납자의 대금(공사, 용역 등) 지급 전 체납금액 압류 누락 방지	재정
	3	국가유공자 등이 과태료 체납 시 과태료 50% 부당 감경 방지	-
	4	식품위생법 위반 업소 과태료 부과 누락 방지	새울
	5	공유재산 무단점용 실태조사에 따른 변상금 부과 누락 방지	새울
	6	국가유공자 등이 과태료 체납할 경우 과태료에 대한 미확인 감경(50%) 방지	새울
	7	세외수입 과태료 체납자에 대한 지방세 과오납 환급금 압류 누락 방지	지방세
	8	세외수입 과태료 체납자에 대한 결손 처리 누락 방지	지방세
	9	세외수입 과태료 체납자에 대한 압류 처리 누락 방지	지방세
	10	부동산 등기 지연 신청자에 대한 과태료 부과 누락 방지	지방세
	11	환경오염 배출업소에 대한 과태료 및 과징금 부과 누락 방지	새울
	12	개발부담금 부과 누락 방지	지방세
	13	세외수입 결손자료 중 재산 여부 확인 누락 방지	지방세
	14	계약 이행지연 사업자에 대한 지연배상금 부과누락 방지	지방재정
	15	도로점용 허가에 따른 점용료 부과 누락 방지	새울
	16	하천점용 허가에 따른 점용료 부과 누락 방지	새울
	17	공유수면 점용허가에 따른 점용료 부과 누락 방지	새울
시도 및 새울 행정 (11)	1	국가유공자 등이 세외수입 체납 시 추정차위반과태료 부당 감경 방지	세외수입
	2	주정차위반과태료 체납자에 대한 지방세 과오납 환급금 압류 누락 방지	지방세
	3	주정차위반 사전통지기간 이후 부과고지 처리 누락 방지	-
	4	주정차위반 납부기간 이후 체납처리 누락 방지	-
	5	공유재산 토지 처분 후 소유권 이전 누락 방지	-
	6	공유재산 매각에 따른 공유재산 대장의 처분처리 누락 방지	-
	7	재산세 과세자료를 활용한 농지 자료 정비	지방세
	8	교통유발부담금 미부과 방지	지방세
	9	교통유발부담금 체납자에 대한 압류 처리 누락 방지	지방세
	10	환경개선부담금 체납자에 대한 세외수입 과오납 환급금 압류 누락 방지	세외수입
	11	환경개선부담금 체납자에 대한 지방세 과오납 환급금 압류 누락 방지	지방세
지방인사 (10)	1	근무연수 산정 오류에 따른 정근수당 부당 지급 방지	-
	2	신분변동자의 수당 부당 지급 방지	-
	3	승진임용 제한자의 부당 승진 임용 방지	-
	4	징계처분 등 승급 제한자의 호봉 승급 방지	-
	5	정액급식비 집행 부적정	-
	6	육아휴직수당 부당 지급 방지	-
	7	급여미지급 대상자 급여 부당 지급 방지	-
	8	대우공무원 부당 임용 방지	-
	9	시간제 공무원의 부당 수당 지급 방지	-
	10	신규임용자의 직급보조비 미지급 방지	-

청백-e 시스템 전국 보급 사업

목 차

- I 사업 개요
- II 청백-e 시스템 개념 및 기능
- III 주요 과업내용
- IV 보급 및 확산일정

1. 사업개요

사업개요

- 사업명 : 청백-e 시스템 전국 보급 사업
- 사업기간 : 2014년 3월 1일 ~ 12월 31일(10개월)
- 대상기관 : 15개 시·도 및 217개 시·군·구
- 발주금액(외주용역금액) : 12,216백만원

보급일정

- 자치단체 별 특성, 접근성, 규모 등을 고려, 총 5차에 걸쳐 보급

구분	해당 시·도	추진 일정
1차 (3개)	인천, 경기, 전북	2014년 4월 ~ 5월
2차 (4개)	부산, 대구, 강원, 경북	2014년 5월 ~ 6월
3차 (3개)	울산, 전남, 경남	2014년 6월 ~ 8월
4차 (3개)	서울, 광주, 제주	2014년 7월 ~ 9월
5차 (4개)	대전, 세종, 충남, 충북	2014년 9월 ~ 10월

II. 청백-e 시스템 개념 및 기능 (1)

시스템 개념 (1)

비리 위험 사전 예방, 업무효율성 강화 등 내부통제 강화 시스템

비리 및
비정상업무
분석

위험
경보

상시
검증

- IT를 기반으로 한
자치단체 업무처리 현황
및 과거 감사사례 등을 분석
: 예방행정 시나리오 개발 및
시스템 상 기능 구현

- 경보요건에 해당하는
핵심위험 또는 위법행위
발생 시 경보 발령
- 잘못 처리된 행정업무에 대한
사전 알림

- 모니터링 사항에 대한
자체 점검 및 업무개선
: 자기 검증을 통한
자체 정화 기능 강화
- 업무 담당자 스스로가 처
리한 업무에 대한 정합성
파악

II. 청백-e 시스템 개념 및 기능 (2)

시스템 개념 (2)



II. 청백-e 시스템 개념 및 기능 (3)



시스템 주요기능

기능 구분	주요 내용	비고
예방 시나리오 개발 · 관리	예방행정 시나리오의 발굴, 검증, 등록, 적용, 평가, 폐기 등 생애 주기 관리 기능	실무기획단 수시 점검 필요
예방행정 모니터링 기능	예방 시나리오 별 모니터링 주기에 따라 데이터, 취합, 비교, 분석을 통한 예방행정 모니터링 기능 구현	핵심 기능, 비리 발생 사전 예방
통계 분석 관리	상시모니터링 처리 결과를 기반으로 사용자 및 상급자가 필요한 각종 통계정보 제공(모니터링 결과에 따른 신규 과세 등 비용효과 포함)	상급자, 관리자 중심 기능 개발
감사업무 지원	상시모니터링을 위해 취합된 데이터를 활용, 필요 시 전산감사 기법을 통한 사후 감사업무 지원	필요 시 감사 부서에서 활용
클린행정 포털 기능	상시모니터링 관련 공무원의 정보 공유, 감사관련 일정 및 착안사항 등 감사부서 정보 공유 등 포털 기능 제공	감사부서 공무원 대상 기능
시스템 관리 기능	중앙센터, 자치단체 사용자, 조직, 시스템 운영 관련 기준정보 제공 및 관리 지원(SSO, 도움말 관리 포함)	정보화부서에서 협조 필요

III. 주요 과업내용 (1)

1 확산 대상 자치단체 전산자원 현황조사 및 분석

- 시스템 구축 관련 기본 보급장비 외 추가 필요장비 내역 파악
- 시스템 구축을 위한 일정 협의 및 전산실 현황 조사
- 자치단체 별 예산절감을 위한 전산장비 여유자원 활용 내역 확인 및 실제 활용 가능성 여부 조사
- 개별 자치단체 금융권 자료 연계를 위한 기초자료 조사 및 업무 협의

2 청백-e 시스템 응용 프로그램 배포 및 유효성 검증

- 시범사업을 통해 구현한 78종 예방행정 프로그램 등 청백-e 시스템 기능 전국 배포
- 전국 확산에 따른 프로그램 배포 시스템 개발 및 운영(운영지원 사업단과 협업)
- 자치단체 실무협의회 담당자 합동집무 등을 통해 시스템 운영에 따른 효과성 검증 및 보완사항 도출, 시스템 반영

III. 주요 과업내용 (2)

3 정백-e 시스템 인프라(HW, 상용SW) 및 자료연계 체계 구축

- 시범 자치단체를 제외한 전국 자치단체(광역 15개, 기초 217개) 대상 시스템 보급 및 인프라 구축
- 시스템 기능 구현을 위한 자치단체 개별 행정정보시스템 간 연계 및 모니터링 대상 자료 DB구축
- SSO(Single Sign On, 통합로그인) 및 사용자 권한 부여 기능개발
- 예방행정 프로그램(기존 78종, 신규 12종) 적용을 위한 자치단체별 행정정보시스템 및 금융자료 간 자료연계 체계 구축

4 시스템 보급 자치단체 교육 및 운영지원

- 시스템 사용자 대상 접속방법, 권한부여 방법, 시스템 개념, 예방행정 프로그램 개념 및 처리방안, 운영지원 홈페이지 활용 방안 등 교육
- 각 자치단체별 1회 방문교육(정기), 사업단 내 상설 교육장 마련 및 전문강사 배치 후 추진(수시)
- 보급 및 확산 자치단체 대상 서비스 접수 및 처리 등 운영지원

담당자 연락처

- 한국지역정보개발원 지역정보화본부 정보화개발과
김유석 책임 (02-3279-0842, yskim@klid.or.kr)

2014년도 자치단체 우수정보시스템 공동활용 지원

목 차

- I** 사업 개요
- II** 업무 현황
- III** 주요 과업내용

I. 사업개요

사업개요

- 사업명 : 2014년도 자치단체 우수정보시스템 공동활용 지원
 - 사업기간 : 2014년 3월 1일 ~ 12월 31일(10개월)
 - 발주금액(외주용역금액) : 167백만원(공고 진행 중)
 - 주요내용
 - 전자정부서비스 활성화(우수사례 전국 확산) 방안 수립
 - 우수정보시스템 공유서비스센터 운영지원 및 기능개선
 - 2008~2011년도 우수정보시스템(7종) 설치·보급 및 운영지원
 - 정보연계시스템(지역정보전달체계) 운영지원
- ※ 자치단체 우수정보시스템 공동활용 지원
- (추진목적) 자치단체에서 자체 개발하여 사용중인 우수정보시스템을 공동으로 활용하여 중복 개발에 따른 예산낭비를 방지하고, 행정의 효율을 제고
 - (추진업무) 우수정보시스템 발굴, 선정, 보급, 설치, 교육, 발전방안 수립 등에 필요한 운영지원

II. 업무 현황

우수정보시스템 선정 및 보급현황

◦ '08~'11년 우수정보시스템(7종) 보급 현황 (총 328개 보급)

- 2008년 : 우편모아 (139), 맞춤형세무정보 (43)
- 2009년 : 기업SOS넷 (39), e-자료모아 (49), 공사하자관리 (8)
- 2010년 : 온라인 협업장터 (5), 내고장부동산광장 (4), 마스터코칭 (31),
- 2011년 : 공공일자리사업관리 (10)

◦ '13년 우수정보 공동활용 시스템 (9종) 선정 현황

- 상반기 (5종) : 대사증후군통합DB(서울특별시), 간부청렴도평가(서울 송파구)
체납정보원클릭(경남 거제시), 민원처리단축지원(경기 동두천시)
기후변화적응농업기술정보서비스앱(제주 제주시)
- 하반기 (4종) : 체납차량알리미(서울 송파구), 추정분담금정보(인천광역시)
농정보조사업지원(강원 횡성군), 재정정보공개(충청남도)

◦ 우수정보시스템 공유서비스센터 운영

우수정보시스템 후보사례 추천, 설문조사, 선정된 시스템(맞춤형 표준/운영가이드) 등록,
시스템 보급 등을 온라인으로 통합 관리하여 기관간 자율적인 추천과 도입을 유도

III. 주요 과업내용

업무내용

- 우수정보시스템 공유서비스센터 운영지원 및 기능개선
 - 산출물 표준화 관리, 연계협의, 개선사항 분석 등 형상관리 지원
 - 공유서비스센터 내 민간참여 기능 고도화 및 사용자 편의성 증대
- 도입기관 환경에 맞게 도입·운영할 수 있도록 맞춤형 표준·운영가이드 제시
 - 자치단체별 운영환경에 따라 기능개선 등에 활용할 수 있도록 표준화 및 연계·기술 보급 지원
 - 도입기관에서 시스템 설치 등에 참조할 수 있도록 매뉴얼 작성, 개발지침 및 검토사항을 안내
- 2008~2011년 표준화된 우수정보시스템 설치·보급 및 운영지원
 - 시스템 도입 희망기관에 대한 설치 및 기초자료 입력 지원
 - 법령, 정책 등의 변경으로 인한 프로그램 보완 및 수정내용 배포 지원
- 담당자 연락처 : 한국지역정보개발원 정보화개발과 이설민 책임 (02-3279-0873)

**2014년 지방자치단체 정보화사업 사전협의
시스템 유지관리 및 운영지원 사업**

목 차

- I 사업 개요
- II 시스템 현황
- III 주요 과업내용

I. 사업 개요

사업개요

- 사업명 : 2014년 지방자치단체 정보화사업 사전협의 및 시스템 운영지원
- 사업기간 : 2014년 3월 1일 ~ 12월 31일(10개월)
- 발주금액(외주용역금액) : 172백만원(공고 진행 중)
- 사전협의 제도
 - 지방자치단체가 추진하는 정보화사업이 타 행정기관에서 운영 계획 중인 정보화 사업과 중복되는지 사업 추진 전 심의 조정함으로써 정보시스템간 상호 연계, 공동이용 활성화, 중복투자 방지를 촉진하기 위한 제도
- 법·제도적 근거
 - : 전자정부법 제67조, 동법시행령 제82조, 제83조, 제88조, 안행부 예규 제19호


사업경과

- 협의조정지원시스템 구축(2004.6) 및 정보화정책지원시스템 구축 완료(2005.9)
 - 지방자치단체 정보화사업 협의조정을 위한 기반 확립 및 시스템 고도화
- 정보화사업 협의조정시스템 유지관리 위·수탁 협약(2006.12 ~ 현재)
- 지방자치단체 및 중앙부처 사전협의 지원시스템 통합 구축(2013.12)

II. 시스템 현황

사전협의시스템 현황

- 사전협의시스템은 사전협의 신청, 검토결과 등록, 사업완료 등록 등 전반적인 사업 진행 정보를 관리하고, 기관별 사전협의 현황, 사업추진현황, 시스템 운영 관련 현황 통계 등을 제공

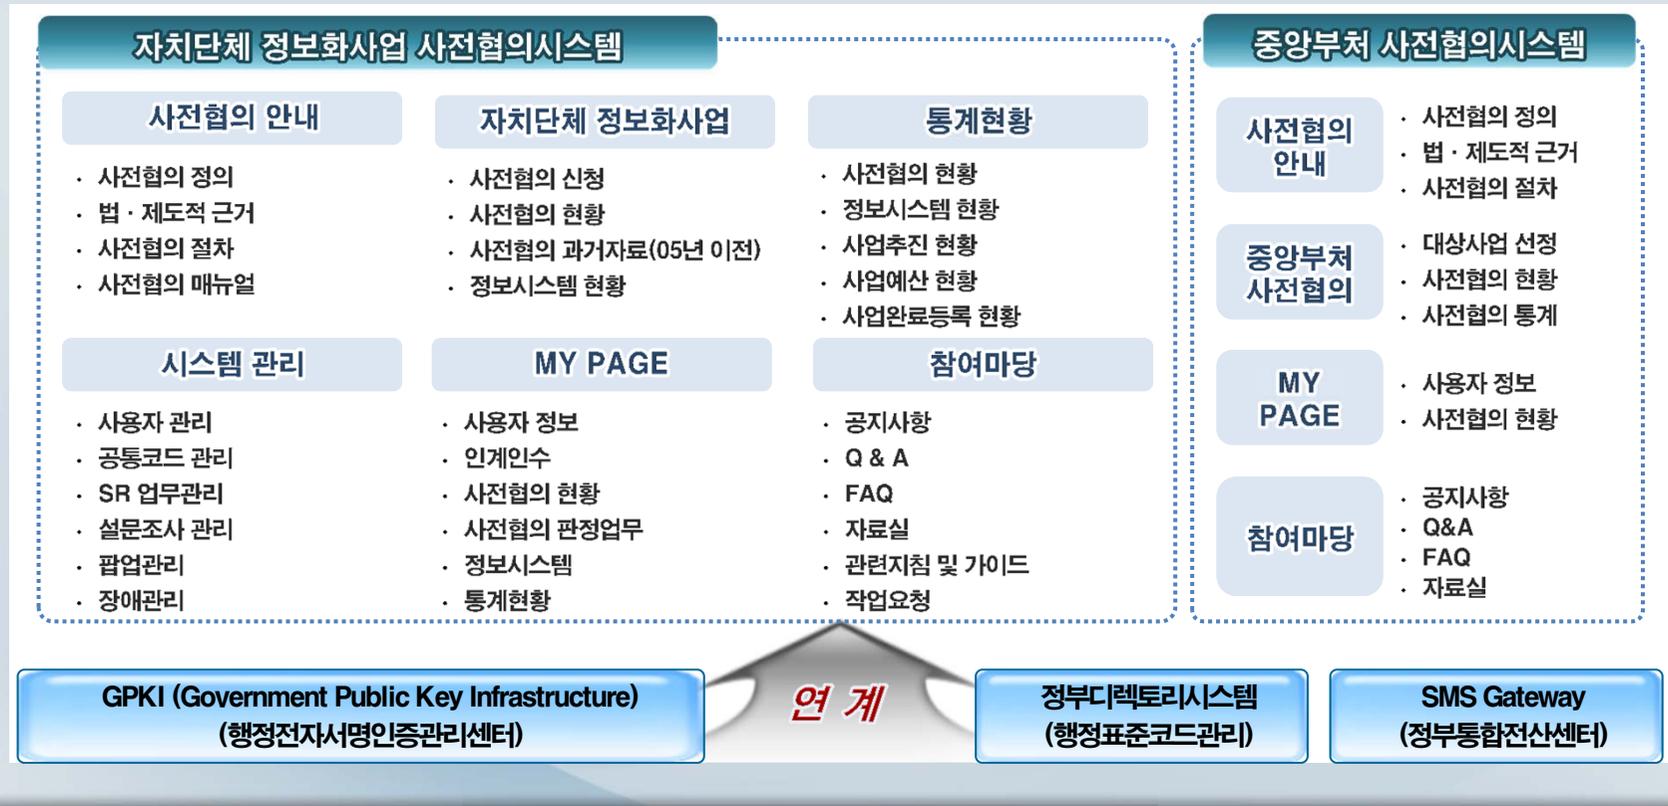

III. 주요 과업내용

정보화사업 사전협의시스템 유지관리 및 운영지원 과업내용

- 정보화사업 사전협의시스템 유지관리
 - 응용 SW 기능 유지관리, 유지관리 절차 관리, SW 기능 품질관리
 - SW 기능 개선, 형상 및 품질관리 등
- 정보화사업 사전협의시스템 운영지원
 - 서비스요청(SR) 관리, 운영인력 내부교육, 사전협의 제도 운영 지원(통계자료 작성 등)
 - 권역별 합동 설명회, 업무 담당자 실무교육 지원, 사전협의 운영실태 점검 지원, 사전협의 실무편람 작성 지원, 서비스 만족도 조사 지원 등
- 범정부 EA시스템과 통합 지원
 - 시스템 전환대상 기능 도출, 이관자료 범위 및 자료량 산출, 시스템 및 자료 이관에 대한 결과 검증 등 지원방안 수립
 - 이관대상 데이터 구성 및 통합시스템 자료이관 지원, 통합시스템 구축 및 시범운영 지원 등

담당자 연락처

- 한국지역정보개발원 지역정보화본부 정보화개발과
예광호 책임 (02-3279-0843, kwangh97@klid.or.kr)

정보화마을 운영 및 유지관리

목 차

- I 사업 개요
- II 시스템 또는 업무 현황
- III 주요 과업내용

I. 사업개요

사업개요

- 사업명 : 2014년 정보화마을 운영 및 유지관리
- 사업기간 : 2014.3.1부터 2014.12.31까지(10개월)
- 발주금액 : 2,261,133천원(VAT 포함)

주요성과

- 교육, 홍보 등 전자상거래 지원을 통한 주민 소득 증대로 서민경제 활성화
※ 매출(44억 '07년 → 385억' 13년), 방문자 수(771만명/ '07년 → 1,650만명/ '13년)
- 정보이용 생활화를 통해 정보격차 해소에 기여
: 정보인프라 구축 및 주민 정보화 교육으로 각종 민원 서비스 등
※ 지역주민 정보화 교육 : 26,897명' 07년 → 58,193명' 12년
- 서민경제 활성화, 정보격차 해소, 2011년 UN공공행정상 대상 수상

II. 업무 또는 시스템 현황

정보화마을 현황

○ 정보화마을 운영 업무

- 정보화마을 사이트의 전문화 된 운영 및 활성화
- 전자상거래(인빌쇼핑)운영을 통한 지역경제 활성화 및 주민소득 증대 지원
- 우수사례 발굴, 주민 정보화교육 및 컨설팅 등 마을 운영활성화 지원
- 정보화마을 중앙시스템 유지관리 및 운영

○ 정보화마을 시스템 현황

- HW 및 상용SW : HW(64식) 및 상용 SW(66식)
 - ※ 현재 대상 장비는 목동KT IDC센터에 설치 운영 중
- 중앙시스템 개발 SW : 중앙 개발 SW(11종) 및 공통기능(27종)
 - ※ 중앙 개발 SW : 대표/마을 홈페이지, 인빌쇼핑, 인빌체험, 인빌뉴스, 커뮤니티, 정보채널, 운영관리 등
 - ※ 공통기능 : 상점홍보, 자매결연, 자유게시판, 공지사항 등 27종

III. 주요 과업내용(1)

정보화마을 운영 및 유지관리 사업 과업내용

- 정보화마을 중앙시스템 유지관리
: 정기 예방점검, 장애 복구 모의훈련, 홈페이지 기능 개선 등
- 지역별 정보격차 해소를 위한 교육 지원
: 관리자/위원장 등 마을리더 대상 교육, 전자정부 서비스 교육 등
- 지역경제 활성화 및 주민 소득 증대방안 마련
: 전자상거래 표준모델, 전문MD 통합마케팅, 제휴 등
- 지역경제 활성화 및 주민 소득 증대방안 마련

III. 주요 과업내용(2)

정보화마을 운영 및 유지관리 사업 과업내용(계속)

- 전자상거래 표준모델 및 마을 유형별 발전모델 수립을 위한 컨설팅
- 고객서비스 만족도 향상을 위한 지원
: 온라인 결제 프로세스 간소화, 서비스데스크 위탁 운영 등
- 해외 기관 대상 정보화마을 우수사례 전파 및 국제교류 협력지원
- 도시형 소비마을 지정 및 정보화마을 홍보관 시범운영 지원

▣ 담당자 : 컨설팅과 과장 김권수, 책임 이호섭(02-3279-0868)

※ 1월 20일 조달발주(예정), 2월 6일 별도 제안요청설명회 실시(예정)

**정보화마을 홈페이지 및
전자상거래 서비스 개선 사업**

목 차

- I 사업 개요
- II 시스템 또는 업무 현황
- III 주요 과업내용

I. 사업개요

사업개요

- 사업명 : 정보화마을 홈페이지 및 전자상거래 서비스 개선 사업
- 사업기간 : 계약체결일 ~ 2014.12.31
- 발주금액 : 3,732,100천원(VAT포함)

사업경과

- 정보화마을 중앙시스템 및 마을 홈페이지 구축 : 2001~ 2009년
- 정보화마을 DB서버 등 일부 시스템 개선 : 2011년
- 시·군·구 개발원 간 위탁 협약체결 : 2013.12~1월

II. 업무 또는 시스템 현황

정보화마을 현황

○ 시도 별 마을 현황 및 사업 대상 마을

	부산	대구	광주	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	계
마을수	4	2	4	1	53	57	22	36	39	48	47	29	17	359
대상 마을수	4	-	-	1	38	50	19	30	36	30	43	23	13	287

○ 정보화마을 시스템 현황

➤ HW 및 상용SW : HW(64식) 및 상용 SW(66식)

※ 현재 대상 장비는 목동KT IDC센터에 설치 운영 중

➤ 중앙시스템 개발 SW : 중앙 개발 SW(11종) 및 공통기능(27종)

※ 중앙 개발 SW : 대표/마을 홈페이지, 인빌쇼핑, 인빌체험, 인빌뉴스, 커뮤니티, 정보채널, 운영관리 등

※ 공통기능 : 상점홍보, 자매결연, 자유게시판, 공지사항 등 27종

III. 주요 과업내용(1)

정보화마을 홈페이지 구축 및 운영환경 개선

- 웹 접근성 및 웹 표준 준수를 통한 웹 접근성 인증마크 획득
- 정보화마을 대표홈페이지(www.invil.org) 전면 개편
- 마을홈페이지 표준안 마련 및 기존 마을홈페이지와 호환성 보장
- 마을홈페이지 콘텐츠 이관 및 신규 등록
- 다양한 웹 브라우저 및 모바일 서비스 제공
- 정보화마을 주민 및 관리자 간 커뮤니티 기능 강화

III. 주요 과업내용(2)

전자상거래 서비스 개선

- 전자상거래 전용 솔루션 도입
- 통계 자료를 활용한 소비자 맞춤형 기능 구현
- 다양한 웹 브라우저 및 모바일 서비스 제공(별도 앱 구축 포함)
- 안정적이고 정확한 검색 기능 제공
- 콘텐츠관리 기능 구현을 통한 체계적 상품관리
 - ▣ 담당자 : 컨설팅과 과장 김권수, 선임 정희영(02-3279-0869)
 - ※ 1월 20일 조달발주(예정), 2월 6일 별도 제안요청설명회 실시(예정)

감사합니다.
감사합니다.
감사합니다.

 **KLID** 한국지역정보개발원

 **KLID** 한국지역정보개발원
